布比中东业务经营方案

目标、预算与资金需求重算

企业业务 **332** 万美元
产业项目附条件增量 **144** 万美元

首年目标应随交付容量和回款条件一起批准。
覆盖阿联酋与沙特，保留三档情景和跨年履约安排。

原目标为什么需要重算

原设计	缺少的依据	本次处理
180 万美元签约	数量、单价、市场及容量交叉验证	按项目及销售路径重建
160 万美元现金支出	岗位月份、项目工时、付款排期	逐月计算现金峰值
总部约 2 名工程资源	同时交付多个项目的可行性	核对工程人月与并发

旧版算术可以衔接，但更接近试水预算，不能直接作为中东业务能力上限。

公司体量决定投入级别

25%–31%

新版首年收入相对公司参考体量

公司收入参考：人民币 0.96–1.18 亿元
新版收入： 410 万美元
换算假设： 7.2 人民币 / 美元

公司收入来自用户材料，年份及合并口径待核。
只能用于量级约束，不能当作最新审计营收。

市场空间与证据分歧

数据	公开摘要	模型用途
UAE 区块链 2025	8.186 亿美元	宽口径参照
沙特区块链 2025	3.807 亿美元	宽口径参照
沙特另一出版商	112 亿美元	差约 29 倍，不混合平均
MENA 链上流量	3387 亿美元	交易额，不能充作软件收入

商业研究口径分歧很大。市场用于校验空间，不能直接乘一个份额得到布比销售额。

476 万美元需要哪些合同

项目组合	单项净额	数量	签约合计
收费验证	8	8	64
企业实施与年度支持	67	4	268
产业实施与年度支持	144	1	144
合计		13	476

4 个生产客户来自 8 个验证客户，企业客户不重复累计。
另有 1 家产业运营方，共 9 家独立客户；全部为计划槽位。

单价同时受成本和客户价值约束

合同	净额	全周期直接成本	毛利率
收费验证	8	4.1	48.8%
企业平台	67	32.35	51.7%
产业平台	144	74	48.6%

直接成本含工程、外包、云、安全、支持和 5% 佣金。
工时与报价是可调假设，尚无当地成交样本支持“行业均价”。

目标比风险调整规划值更有挑战

380 万

风险调整规划签约

企业路径 289.4 万
产业路径 90.7 万
476 万目标高出约 25.2%


80 企业 /12 运营方仅支持当前漏斗值； 4 生产 /1 产业的期望需至少 97/20 账户。
概率是经营假设；没有真实 CRM ，不能称为已验证预测。

首年三档情景

万美元	谨慎进入	资源到位	突破
净签约	166	476	786
确认收入	143	410	489
回款	87	375.5	479.3
经营贡献	-33.3	69.1	61.2
现金支出	172.4	335.9	467.4


突破情景签约更高，但部分实施跨年，首年利润并不高于资源到位情景。

年度现金为正仍需要启动资金

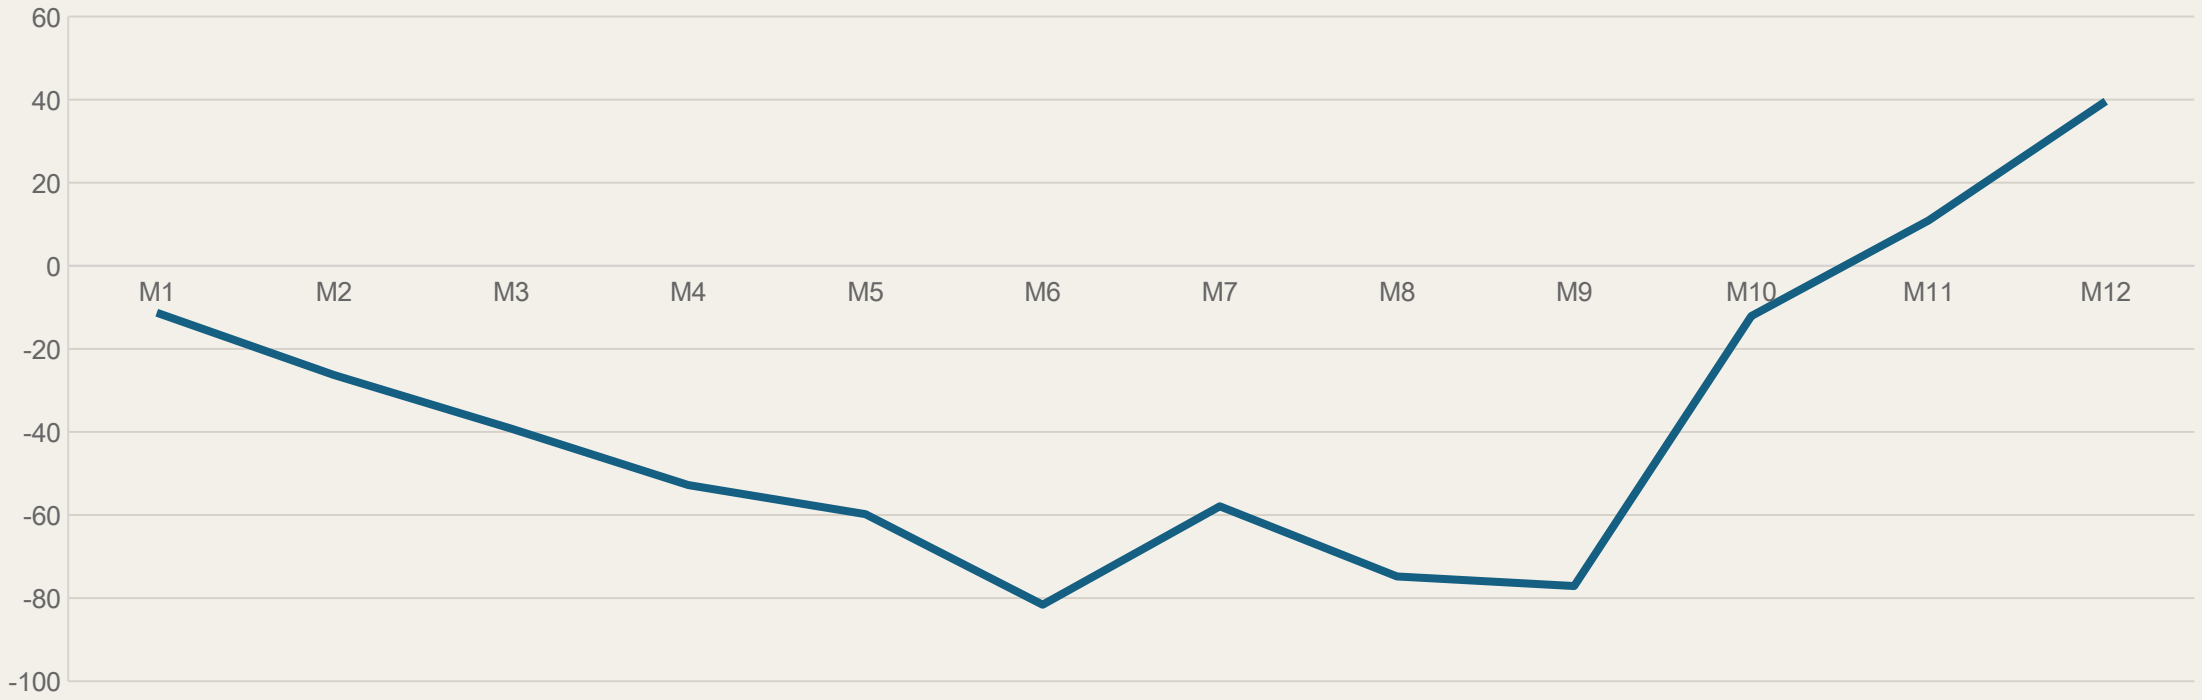

M6 累计缺口 81.6 万；年底回流 39.6 万。加 26.6 万固定费用储备，需 108.2 万周转额度。

提高目标必须配套交付资源

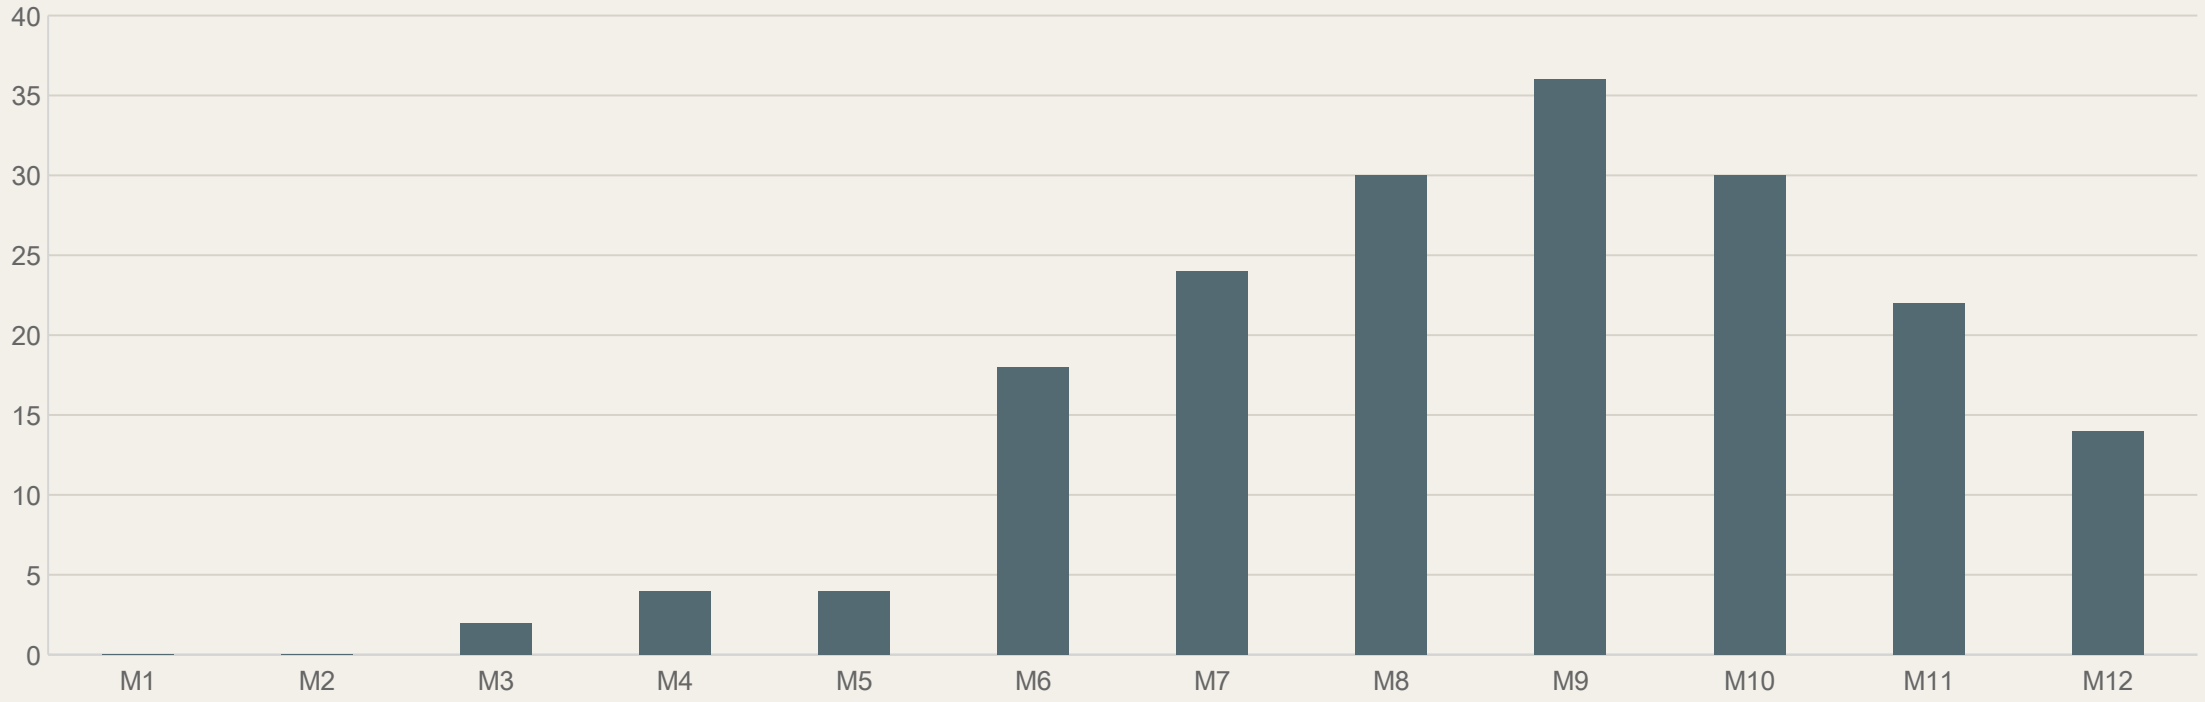

全年 138 个有效工程人月，平均名义 15.3 人，峰值 36 人。
36 人仅为实施峰值；另需支持团队和本地固定岗位。

固定费用按岗位与月份核算

费用组	Y1 万美元	主要依据
本地团队	73.72	5.5 名义岗位，分月到岗
非人力费用	50.8	设立、法务、办公、获客、本地化
固定费用合计	124.52	项目工程成本另列，避免重复
直接现金成本	211.375	按每个项目工期及回款计算

Hays 2025 版架构师固定月薪中值 AED42,500 ，数据时点 Q4 2024 。
更新 5% 及雇主负担系数均为预算假设。

延期比宏观增速更影响结果

压力变化	收入	经营贡献	周转含储备
基准	410	69.1	108.2
签约整体延后 3 个月	103	-92.5	134.9
回款再延后 2 个月	410	69.1	188.3
报价下降 15%	348.5	11.1	125.1
延迟及成本双压	103	-102	225.6

单位：万美元。经营贡献为税前区域指标，未计融资及总部公共管理分摊。

两国分工与签约路径

阿联酋	沙特
4 个验证 + 2 个企业平台	4 个验证 + 2 个企业平台 + 1 产业平台
规划签约 166 万美元	规划签约 310 万美元
集团采购、贸易与跨境凭证样板	产业运营方、大型集团与本地交付

国家分配是经营假设。产业线 M1 启动开发，不能等全部企业试点结束后才开始。

季度里程碑和拨款条件

阶段	业务证据	资金动作
D90	可售产品、预算方案、运营方工作会议	M1 先 50 万；最迟 M3 末再 50 万
D180	4 验证、 1 企业生产、产业合同或明确降档	产业未成则改为企业路径
M5 前资金	提前核实排期和 13 周现金	第三批 20 万须最迟 M5 末到位

190 万与 230 万仍是未含附加占用的压力额度。
额度是可用资金，不是预先批准全部支出。

四年发展仍取决于持续交付

万美元	Y1	Y2	Y3	Y4
收入合计	410	665.4	1112.5	1476.1
固定费用	124.5	175	240	320
经营贡献	69.1	177.3	369.3	523.3
期末合同支持 ARR	72	164.4	304	465.6

Y2–4 新增企业 6/9/12 家、产业 1/2/2 家；续费按周年。
后续年度现金未月化，已撤下签约乘 90% 的回款近似。

复盘发现与修正

复盘发现	v2.1 修正
拨款 80 万小于 M6 缺口 81.6 万	50+50+20 ，第三批最迟 M5 末到位
后续年降价和续费公式不完整	报价全期联动；续费按周年保留首期合同
年度签约额被近似当回款	撤下 Y2–4 现金数字，标记需月化
核验公式为文本、数量可超槽位	公式执行；数量与付款边界显示检查

首年基准结果不变；修正不等于验证了成交率、工时和报价。

附加资金须独立测算

资金项	万美元	性质
基础缺口及三个月储备	108.2	原合同及费用模型
合同额 5% 不可回收税费压力	23.8	商业假设，不是法定税率
半数实施合同的 10% 现金保证金	20.2	现金冻结，不是损益费用
示例合计	152.2	可按 160 万讨论，待真实条款校准

若回款再迟两个月，叠加相同附加项约需 232.3 万。
120 万基础额度的余量不能直接视为足够覆盖税费与保函。

建议管理层批准的经营边界

332 万企业核心任务
＋ 144 万产业附条件增量

先锁定产品范围、资源池和周转额度
再把 476 万美元转为正式考核目标

使用配套 Excel 检查假设、合同排期、现金和资源；
公开资料只能支持条件估算，不能替代真实订单与内部财务。
